PROJEKT: **Neubau Verwaltungsgebäude**

KOMMENTAR: **Ressourcenplanung**

AUFTRAGGEBER:

AUFTRAGNEHMER: **ASTA CompetenceCenter**

TERMINPLAN

Gedruckt: **23.11.2004** Fertigstellung: **05.11.2004**

Autor: Gesehen: _____

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer Aufwand	Ende	Zuweisung Anzahl
1	**Baustellenvorhaltung**	**05.07.2004**	**124t**	**05.11.2004**	
2	*Turmdrehkran*	*05.07.2004*	*2961h*	*05.11.2004*	*1,00*
3	Erdarbeiten	06.07.2004	6t	04.08.2004	
4	*Personal*	*06.07.2004*	*120h*	*04.08.2004*	*2,00;3,00*
5	*Tieflöffelbagger*	*06.07.2004*	*24h*	*08.07.2004*	*1,00*
6	*Radlader*	*06.07.2004*	*40h*	*04.08.2004*	*1,00;1,00*
7	Abdichtung + Dämmung	09.07.2004	5t	05.08.2004	
8	*Personal*	*09.07.2004*	*240h*	*05.08.2004*	*6,00;6,00;6,00*
9	**KG**	**12.07.2004**	**17t**	**03.08.2004**	
10	Bodenplatte	12.07.2004	4t	15.07.2004	
11	*Personal*	*12.07.2004*	*96h*	*15.07.2004*	*3,00*
12	Wände	16.07.2004	8t	27.07.2004	
13	*Personal*	*16.07.2004*	*384h*	*27.07.2004*	*6,00*
14	Decken	28.07.2004	5t	03.08.2004	
15	*Personal*	*28.07.2004*	*120h*	*03.08.2004*	*3,00*
16	**EG**	**11.08.2004**	**18t**	**03.09.2004**	
17	Bodenplatte	11.08.2004	3t	13.08.2004	
18	*Personal*	*11.08.2004*	*168h*	*13.08.2004*	*7,00*
19	Wände + Stützen	16.08.2004	10t	27.08.2004	
20	*Personal*	*16.08.2004*	*720h*	*27.08.2004*	*9,00*
21	Decken	21.08.2004	12t	03.09.2004	
22	*Personal*	*21.08.2004*	*672h*	*03.09.2004*	*7,00*
23	**1. OG**	**30.08.2004**	**15t**	**17.09.2004**	
24	Wände + Stützen	30.08.2004	10t	10.09.2004	
25	*Personal*	*30.08.2004*	*560h*	*10.09.2004*	*7,00*
26	Decken	04.09.2004	12t	17.09.2004	
27	*Personal*	*04.09.2004*	*576h*	*17.09.2004*	*6,00*
28	**2. OG**	**13.09.2004**	**15t**	**01.10.2004**	
29	Wände + Stützen	13.09.2004	10t	24.09.2004	
30	*Personal*	*13.09.2004*	*560h*	*24.09.2004*	*7,00*
31	Decken	18.09.2004	12t	01.10.2004	
32	*Personal*	*18.09.2004*	*576h*	*01.10.2004*	*6,00*
33	**3. OG**	**27.09.2004**	**15t**	**15.10.2004**	
34	Wände + Stützen	27.09.2004	10t	08.10.2004	
35	*Personal*	*27.09.2004*	*560h*	*08.10.2004*	*7,00*
36	Decken	02.10.2004	12t	15.10.2004	
37	*Personal*	*02.10.2004*	*576h*	*15.10.2004*	*6,00*
38	**4. OG**	**11.10.2004**	**15t**	**29.10.2004**	
39	Wände + Stützen	11.10.2004	10t	22.10.2004	
40	*Personal*	*11.10.2004*	*560h*	*22.10.2004*	*7,00*
41	Decken	16.10.2004	12t	29.10.2004	
42	*Personal*	*16.10.2004*	*576h*	*29.10.2004*	*6,00*
43	**Überfahrten**	**25.10.2004**	**9t**	**04.11.2004**	
44	Überfahrten - Wände	25.10.2004	5t	29.10.2004	
45	*Personal*	*25.10.2004*	*200h*	*29.10.2004*	*5,00*
46	Überfahrten - Decken	01.11.2004	4t	04.11.2004	
47	*Personal*	*01.11.2004*	*64h*	*04.11.2004*	*2,00*

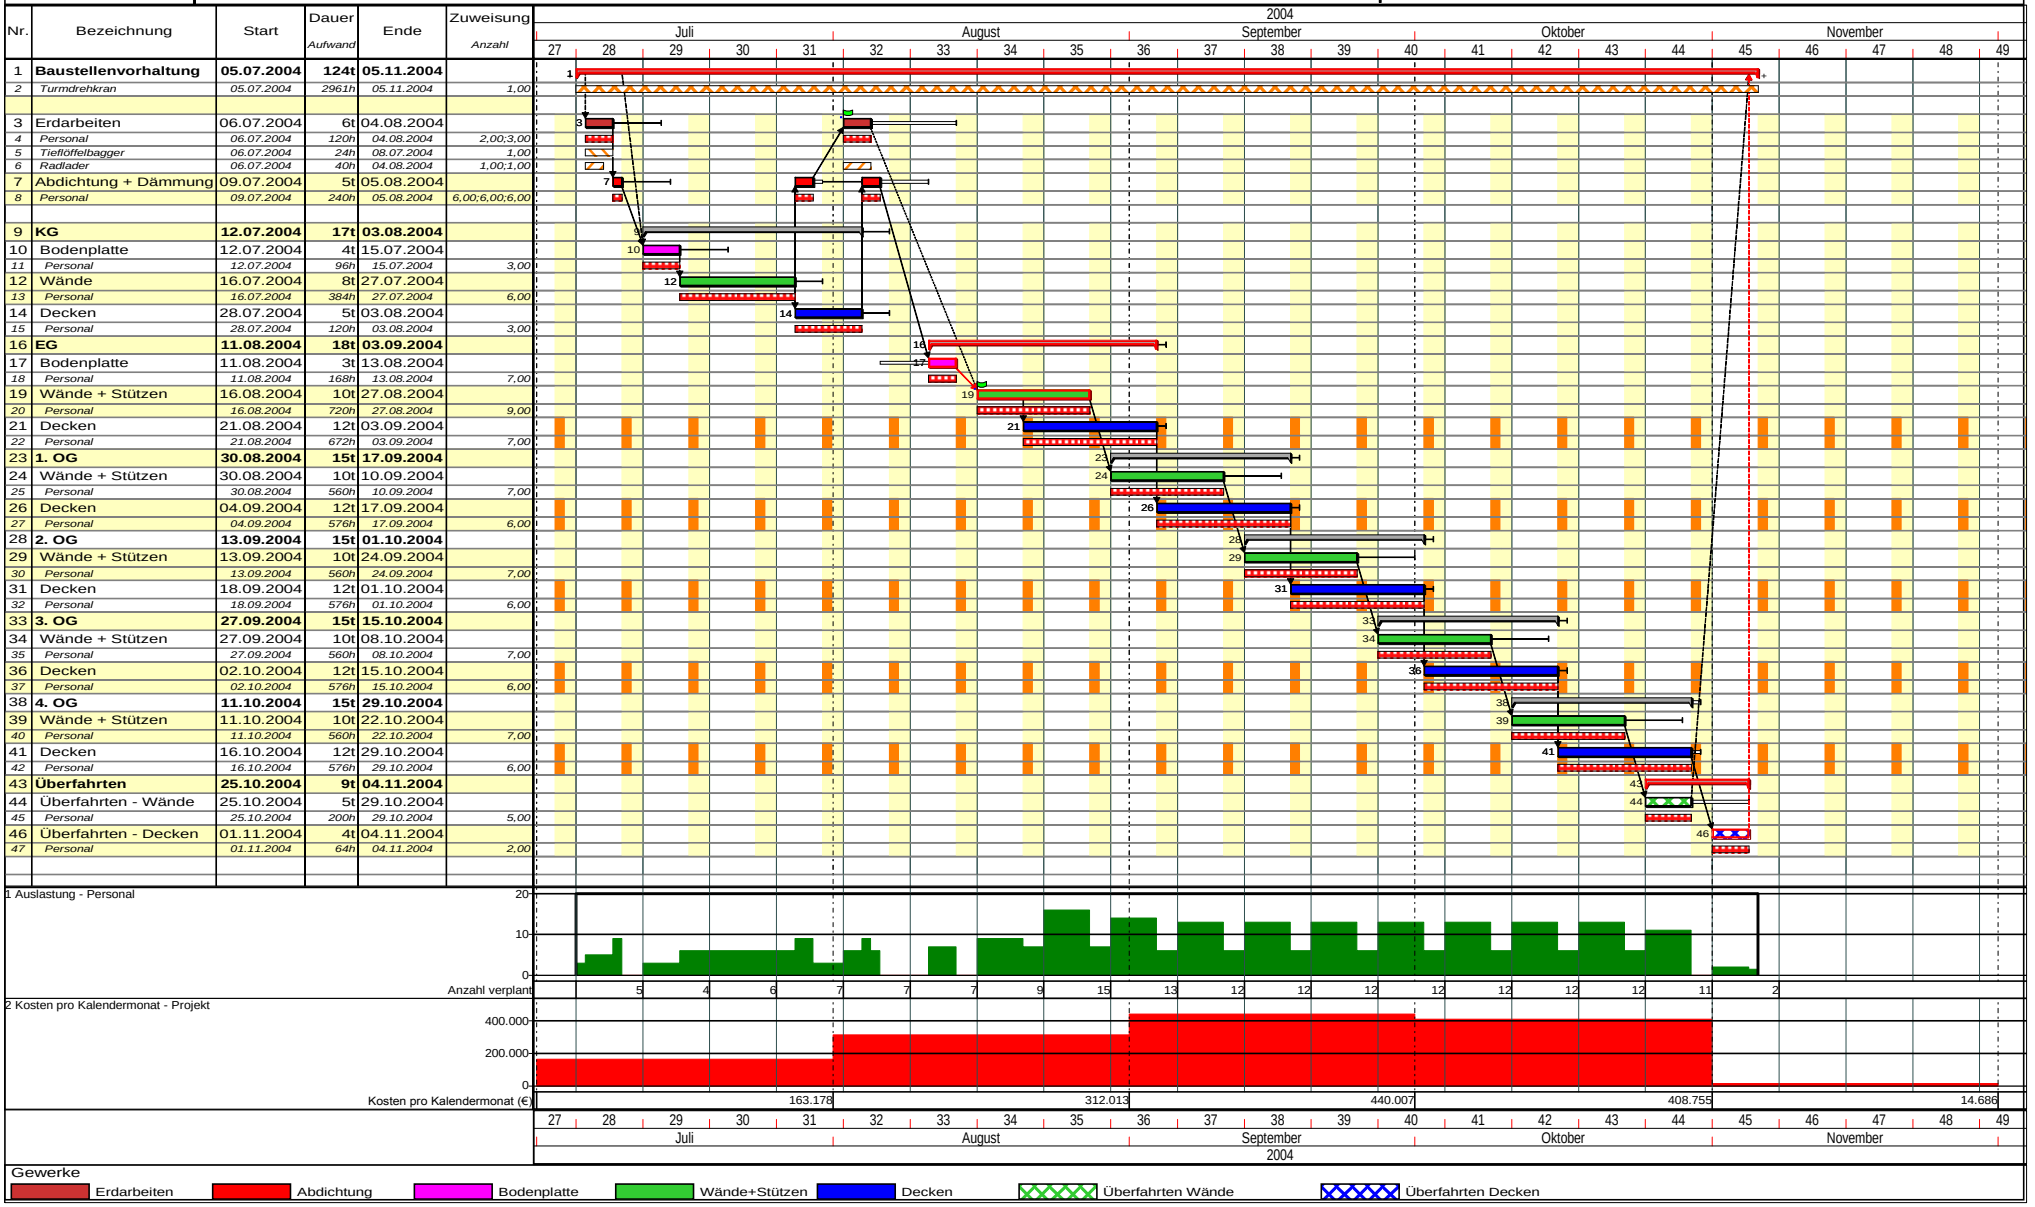

Gewerke

Erdarbeiten | Abdichtung | Bodenplatte | Wände+Stützen | Decken | Überfahrten Wände | Überfahrten Decken
