PROJEKT: **Neubau Stadthalle**

KOMMENTAR:

AUFTRAGGEBER:

AUFTRAGNEHMER: **ASTA CompetenceCenter**

TERMINPLAN

Gedruckt: **23.11.2004** Fertigstellung: **16.01.2006**

Autor: Gesehen: _____

Nr.	Bezeichnung	Unternehmer	Start	Dauer	Ende
1	**Baubeginn**	**Termine**	**28.02.2005**		**28.02.2005**
2	Baustelleneinrichtung	Maulwurf	28.02.2005	5t	04.03.2005
3	**Erdarbeiten**	**Maulwurf**	**07.03.2005**	**5w 1t**	**13.04.2005**
4	Baugrubenaushub	Maulwurf	07.03.2005	3t	09.03.2005
5	Fundamente	Maulwurf	10.03.2005	8t	21.03.2005
6	Kanal	Maulwurf	22.03.2005	12t	08.04.2005
7	Grundung	Maulwurf	11.04.2005	3t	13.04.2005
8	**Stahlbetonarbeiten**	**Mauer & Fuge**	**14.04.2005**	**8w 2t**	**15.06.2005**
9	Montage Wände	Mauer & Fuge	14.04.2005	25t	30.05.2005
10	Montage Decken	Mauer & Fuge	28.04.2005	10t	06.06.2005
11	Aussparungen	Mauer & Fuge	07.06.2005	7t	15.06.2005
12	**Gerüst vorhalten**	**Stahlhuber**	**06.05.2005**	**14w 4t**	**19.08.2005**
13	Aufbau / Abbau	Stahlhuber	06.05.2005	5t	19.08.2005
14	**Dacharbeiten**	**Obenauf**	**16.06.2005**	**4w**	**13.07.2005**
15	Zimmermann	Obenauf	16.06.2005	10t	29.06.2005
16	Dachdecker	Obenauf	30.06.2005	10t	13.07.2005
17	Spengler	Obenauf	07.07.2005	5t	13.07.2005
18	**Fassade / Stahlbau**	**Stahlhuber**	**16.06.2005**	**18w 1t**	**21.10.2005**
19	Stahlbau Vordach	Stahlhuber	16.06.2005	5t	22.06.2005
20	Fassade	Stahlhuber	23.06.2005	40t	17.08.2005
21	Treppengeländer	Stahlhuber	13.10.2005	7t	21.10.2005
22	**Heizung / Sanitär**	**Röhrich**	**31.05.2005**	**28w**	**14.12.2005**
23	Heizung	Röhrich	31.05.2005	25t	14.12.2005
24	Sanitär	Röhrich	07.06.2005	25t	14.12.2005
25	**Elektro / Blitzschutz**	**Blitz & Co.**	**31.03.2005**	**36w**	**14.12.2005**
26	Blitzschutz	Blitz & Co.	31.03.2005	10t	20.07.2005
27	Vormontage Wände	Blitz & Co.	16.06.2005	20t	13.07.2005
28	Vormontage Kanäle	Blitz & Co.	23.06.2005	15t	13.07.2005
29	Vormontage Decken	Blitz & Co.	30.06.2005	19t	26.07.2005
30	Endmontage	Blitz & Co.	01.12.2005	10t	14.12.2005
31	**Innenputz / Estrich**	**Plattenmeier**	**27.07.2005**	**5w 1t**	**31.08.2005**
32	Innenputz	Plattenmeier	27.07.2005	20t	23.08.2005
33	Estrich	Plattenmeier	24.08.2005	6t	31.08.2005
34	**Fliesenarbeiten**	**Plattenmeier**	**15.09.2005**	**6w 3t**	**02.11.2005**
35	Boden	Plattenmeier	15.09.2005	10t	28.09.2005
36	Treppen	Plattenmeier	29.09.2005	9t	12.10.2005
37	Wände	Plattenmeier	13.10.2005	11t	27.10.2005
38	Fensterbänke	Plattenmeier	28.10.2005	3t	02.11.2005
39	**Innenausbau**		**27.07.2005**	**21w 2t**	**09.01.2006**
40	Trockenbau	Plattenmeier	27.07.2005	17t	18.08.2005
41	Abgehängte Decken	Plattenmeier	28.10.2005	13t	16.11.2005
42	Maler	Pinsel	17.11.2005	20t	14.12.2005
43	Teppiche	Pinsel	01.12.2005	18t	09.01.2006
44	Endreinigung	Heinzelmännchen	10.01.2006	4t	13.01.2006
45	Früheste Abnahme	Termine	16.01.2006		16.01.2006
46	Eröffnungstermin	Termine	16.01.2006		16.01.2006

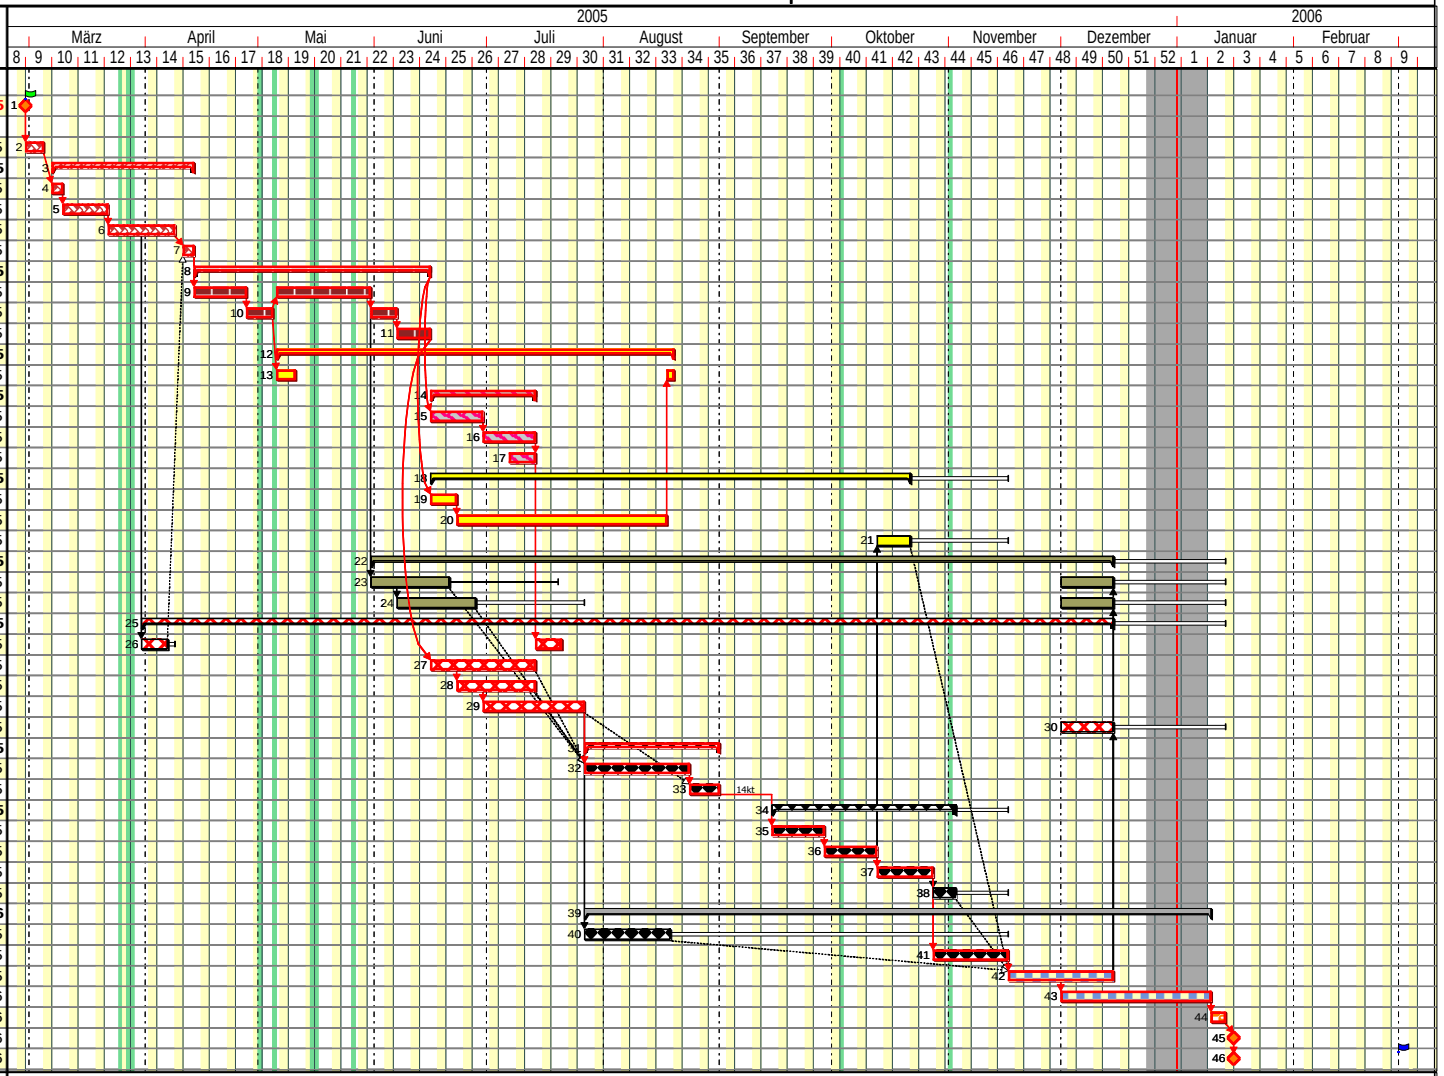

Unternehmer

Termine · Maulwurf · Mauer & Fuge · Stahlhuber · Obenauf · Röhrich · Blitz & Co. · Plattenmeier · Pinsel · Heinzelmännchen
